


ACHEVEMENT TRAVAUX THEATRE ROYAL MARRAKECH



PERSPECTIVE – AMENAGEMENTS INTERIEURS

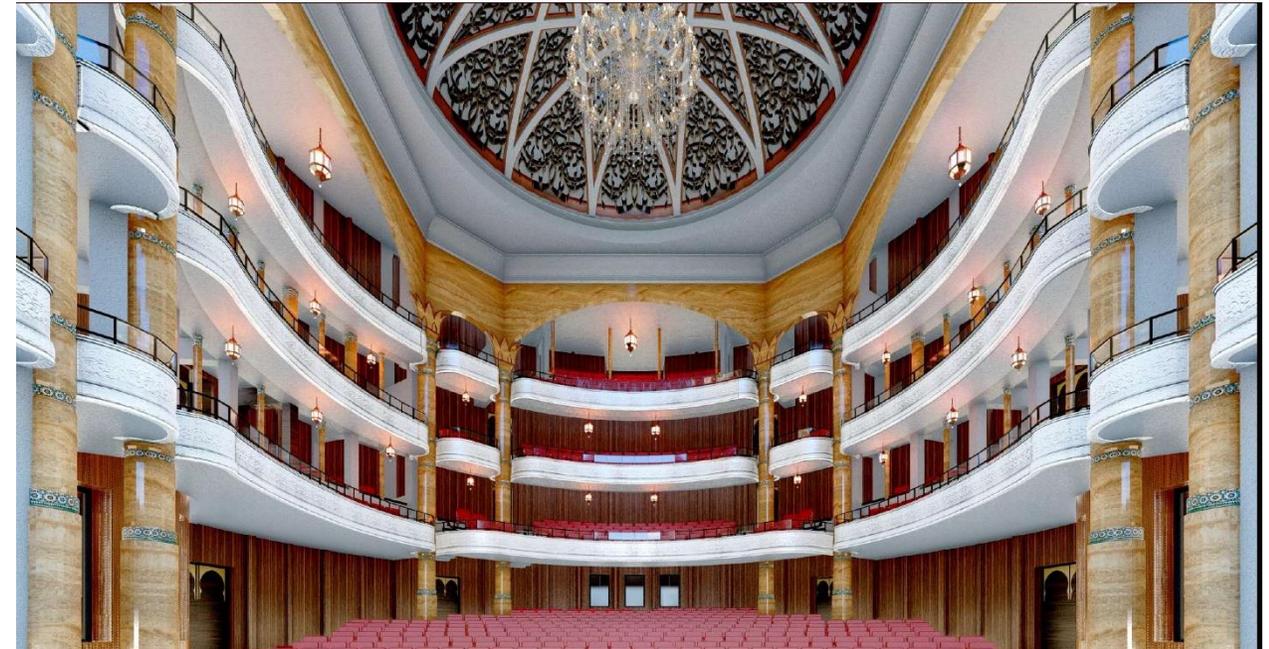

Budget estimatif globale travaux TCE + Etudes – 116 694 209,49 TTC

Date démarrage du projet : 15/09/22

Date achèvement du projet : 15/11/24

PLANNING ETUDE – TRAVAUX



LOT	Budget prévisionnelle TTC	Etat d'avancement	Phase Lancement A.O - ODS	Phase travaux	Date prévisionnelle d'achèvement	
LOT STRUCUTRE	GROS ŒUVRE	5 562 398,40	35%	01/08/2022	15/09/2022	20/09/2023
LOTS TECHNIQUES	ELECTRICITE CFO CFA	10 605 628,80	0%	25/06/2023	01/09/2023	09/05/2024
	CLIMATISATION VMC PROTECTION DETECTION INCENDIE	23 634 769,77	0%	25/06/2023	01/09/2023	09/05/2024
LOT SCENOGRAPHIE	SERRURERIE MACHINERIE SCENIQUE RIDEAUX ET TENTURES	49 167 335,65	0%	25/06/2023	15/09/2023	11/04/2024
	RESEAUX SCENIQUE SPECIALISES SONORISATION VIDEO ECLAIRAGE SCENIQUE		0%	25/06/2023	15/12/2023	15/05/2024
	SIEGES		0%	25/07/2023	15/03/2024	20/05/2024
LOT ARCHITECTURAUX	PLATRIERIE	17 199 395,20	0%	25/07/2023	11/12/2023	21/05/2024
	REJETEMENT SOLS ET MURS		0%	25/07/2023	11/01/2024	15/06/2024
	BOIS ET AGENCEMENT		0%	25/07/2023	15/05/2024	15/09/2024
	MENUISERIE METALLIQUE		0%	25/07/2023	15/05/2024	15/05/2024
	PEINTURE DECORATIVE		0%	25/07/2023	15/07/2024	15/11/2024
TOTAL TRAVAUX TTC		106 169 527,82		01/08/2022		15/11/2024
TOTAL ETUDES TTC		7 125 821,20				
TOTAL TRAVAUX + ETUDES TTC		113 295 349,02				
ALEAS 3% TTC		3 398 860,47				
TOTAL TTC YC ALEAS		116 694 209,49				

PERSPECTIVE - AMENAGEMENT EXTERIEURS




Budget estimatif – 5 000 000,00 TTC (pas prévu dans le budget)

PRISES PHOTOS - NIVEAU RDC

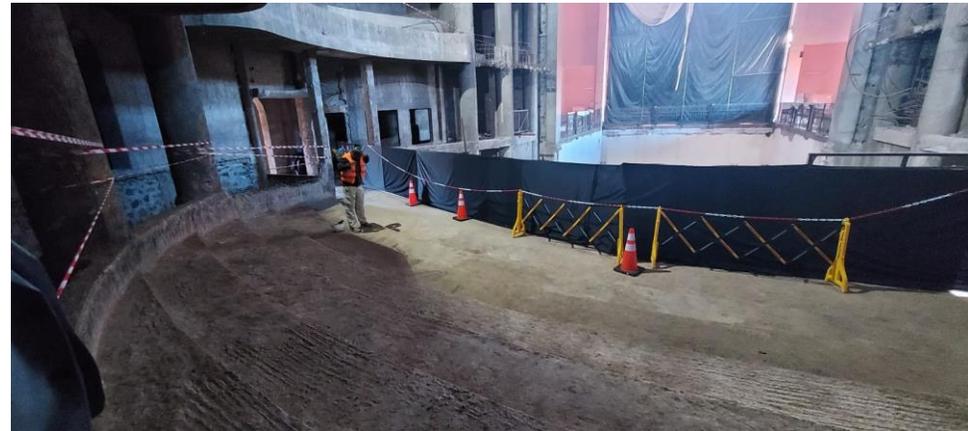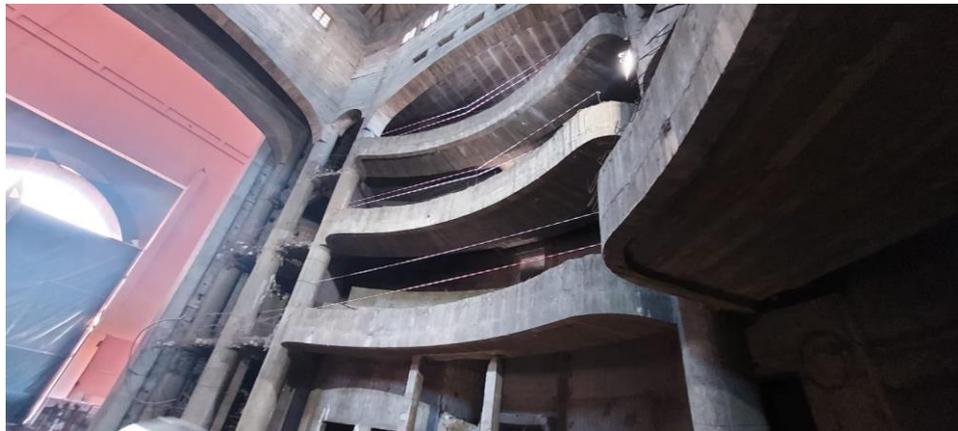

PRISES PHOTOS - NIVEAU SOUS SOL -1

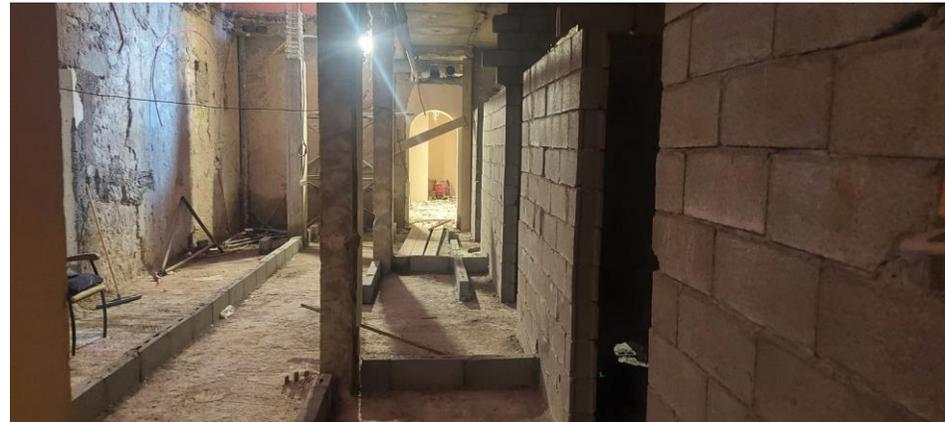

PRISES PHOTOS - NIVEAU SOUS SOL -2

