

# Mise en Valeur de la Medina de Marrakech

Convention 2018-2022



11 MARS 2022

# Programme Mise en Valeur de la Medina de Marrakech 2018-2022

Convention cadre signée le 14 Mai 2018

Une convention spécifique:  
(entre Sté AL OMRANE et Sté SMIT)

10 Partenaires

Coût : 484 MDH

## Objectifs :

- Sauvegarde et valorisation du patrimoine de la Medina,
- Amélioration du cadre de vie de la population

	Montant (MDH)	Nombre projets
Création et aménagement de parkings	54,1	6
Revêtement de passages et aménagement des espaces publics (rues, places, jardins, monuments historiques, Fondouks et environnement)	395,7	45
Adressage et signalisation	1,2	2
Panneaux d'information interactif	3,3	2
Honoraires maître d'ouvrage délégué	29,7	
<b>Total :</b>	<b>484</b>	<b>55</b>

# RÉPARTITION DES PROJETS PAR MAITRE D'OUVRAGE

Partenaires	Désignation des axes de projets	Nombre de projets	
		Nombre par axe	Nombre total
Société AL OMRANE Marrakech-Safi	<b>Création et aménagement de parkings</b>	<b>6</b>	<b>47</b>
	<b>Pavage des circuits et réhabilitation des espaces publics (Ruelles, places, monuments historiques, Fondouks, et amélioration de la qualité de l'environnement)</b>	<b>37</b>	
	Pavage et aménagement des Circuits	18	
	Requalification des places et des espaces publics	3	
	Restauration des monuments historiques et des jardins	10	
	Réhabilitation et requalification des fondouks	6	
	<b>Adressage et signalétique</b>	<b>2</b>	
	<b>Panneaux d'information interactifs</b>	<b>2</b>	
Ministère de la Culture	Abords koutoubia; Bab Agnaou; Palais Badiaâ; Dar Si Said et Jardin Agdal Babhmad	5	5
Secrétariat d'Etat chargé du développement durable	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renforcement du réseau de surveillance de la qualité de l'air par l'acquisition de 04 stations de mesure</li> <li>- Mise en place d'un projet pilote de tri des déchets ménagers à la source</li> <li>- Sensibilisation et éducation à l'environnement</li> </ul>	3	3
<b>Total</b>		<b>55</b>	<b>55</b>

# CONTRIBUTION FINANCIÈRE DES PARTENAIRES

Partenaire		Contribution Globale (Mdh)	Contributions annuelles (Mdh)			
			2018	2019	2020	2021
Ministère de l'Intérieur,		120	10	50	50	10
Ministère de l'Habitat ,		100	15	35	35	15
Ministère du tourisme	Artisanat	20	2,5	7,5	7,5	2,5
	Société SMIT	20	2,5	7,5	7,5	2,5
Fond Hassan II du développement économique et social ,		150	10	50	50	40
Région Marrakech-Safi,		20	5	5	5	5
Commune de Marrakech,		20	5	5	5	5
Commune de Méchouar Kasbah		4	1	1	1	1
Ministère de la Culture		20	3	7	7	3
Secrétariat d'Etat chargé du développement durable		10	1,5	3,5	3,5	1,5
<b>Total</b>		<b>484</b>	<b>55,5</b>	<b>171,5</b>	<b>171,5</b>	<b>85,5</b>

## ACTIONS ENTREPRISES PAR LE COMITÉ DE SUIVI LOCAL PRÉSIDÉ PAR MONSIEUR LE WALI :

Plusieurs actions, toujours engagées et soutenues, à savoir :

- ✓ Tenue périodique des **réunions du comité de suivi, présidé par Monsieur le Wali**
- ✓ Tenue de **plusieurs réunions des commissions thématiques**, présidées par Monsieur le Wali,
- ✓ **Programmation de sorties et visites de chantiers** des différents projets, supervisées par Monsieur le Wali, en présence des partenaires,
- ✓ Constitution **des comités de suivi locaux présidés par l'autorité locale** (chefs de districts), composés des représentants des partenaires concernés,
- ✓ Instauration du comité technique d'approbation des projets,
- ✓ Instauration de la commission administrative de validation des projets,

- ▶ **Comité central de suivi** : présidé par Monsieur le Ministre de l'Intérieur
  - ▶ Périodicité : Semestrielle
  - ▶ Dernière réunion tenue le : 02/12/2021 (Visioconférence)
  
- ▶ **Comité Local de Suivi** : présidé par Monsieur le Wali
  - ▶ Nombre de réunions tenues : 27
  - ▶ Dernière réunion : 14/01/2021
  - ▶ Nombre de visites de chantiers : 61 sorties
  
- ▶ **Comité technique et administratif** : présidé par l'Agence Urbaine de Marrakech
  - ▶ Nombre de projets étudiés par le comité technique : 52 projets
  - ▶ Nombre de projets étudiés par le comité administratif : 42 projets



**1**

Etat d'avancement du programme *de* Mise en Valeur de la Medina de Marrakech

**2**

Planning prévisionnel d'achèvement du programme

**3**

Principales contraintes



*Etat d'avancement du programme  
de Mise en Valeur de la Medina de  
Marrakech 2018-2022*

1



# Etat d'avancement des engagements ou versements des partenaires

Partenaires		Contribution Globale (Mdh)	Contributions annuelles (Mdh)								Déblocage	
			2018		2019		2020		2021		Montant (Mdh)	% Par rapport à la convention
			Prévu	Versé	Prévu	Versé	Prévu	Versé	Prévu	Versé		
Ministère de l'Intérieur		120	10	10	50	50	50		10	10	70	58%
Ministère de l'Habitat		100	15	15	35	35	35		15	15	65	65%
Ministère du tourisme	Artisanat	20	2,5	2,5	7,5	7,5	7,5	7,5	2,5		17,5	88%
	Société SMIT	20	2,5	2,5	7,5	7,5	7,5	7,5	2,5	2,5	20	100%
Fond Hassan II du développement économique et social		150	10	10	50		50		40	30	40	26%
Région Marrakech-Safi		20	5	5	5	5	5	5	5	5	20	100%
Commune de Marrakech		20	5	5	5	5	5	5	5		15	75%
Commune de Méchouar Kasbah		4	1	1	1	1	1	2	1		3	75%
<b>Total</b>		<b>454</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>161</b>	<b>111</b>	<b>161</b>	<b>10</b>	<b>81</b>	<b>62,5</b>	<b>250,5</b>	<b>55,00%</b>

# Avenant de la convention suite aux dépassement , suivant recommandations du Comié Centale du 24-11-2020

Partenaires		Contribution (Mdh)
Ministère de l'Intérieur		22,50
Ministère de l'Habitat		22,5
Ministère du tourisme	Artisanat	-
	Société SMIT	-
Fond Hassan II du développement économique et social		-
Région Marrakech-Safi		15
Commune de Marrakech		15
Commune de Méchouar Kasbah		3
Département environnement		5
<b>Total</b>		<b>83</b>

**Avenant validé ; En cours de signature**

# ETAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER

Partenaires	Etat des Contributions 2018-2022 (Mdh)							
	Prévu	Débloqué	Taux de déblocage	Engagé	Taux d'engagement	Taux d'avancement physique (A)	Taux d'avancement des études (B)	Taux d'avancement 90 % Global (A)+10%(B)
Société Al Omrane Marrakech (MOD)	<b>454</b>	<b>250</b>	<b>55%</b>	<b>433,78</b>	<b>99 %</b>	<b>71,1%</b>	<b>99%</b>	<b>73,89%</b>
Ministère Chargé du développement durable	<b>10 (15)</b>	-	<b>150%</b>	<b>8,28</b>	<b>55,2%</b>	<b>52,93%</b>	<b>90%</b>	<b>55.73%</b>
Ministère de la Culture	<b>20</b>	-	<b>80%</b>	<b>16,17</b>	<b>80,85%</b>	<b>87%</b>	<b>100%</b>	<b>88,3%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>484 (499)</b>	-	-	<b>458,23</b>	<b>94.7%</b>	-	-	<b>74,2%</b>

## ETAT D'AVANCEMENT PAR PROJETS

TOTAL	PROJETS ACHEVES	PROJETS EN COURS DE TRAVAUX	PROJETS NON ENTAMES	TOTAL	OBSERVATIONS
Société Al Omrane Marrakech (MOD)	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>47</b>	
Ministère délégué Auprès du Ministre de l'Energie, des Mines, de développement durable et de l'Environnement, Chargé du développement durable	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	
Ministère de la Culture	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>04</b>	<b>55</b>	

## Etat d'avancement du programme MEV 2018-2022

Evolutions enregistrées entre le 02 Décembre 2021 et le 14 Janvier 2022

	02 Décembre 2021	14 Janvier 2022	Variations
<b>Engagements financiers (en MDHS)</b>	<b>457,73</b>	<b>458,23</b>	<b>+0,5</b>
<b>% d'engagements financiers</b>	<b>95%</b>	<b>94,68%</b>	<b>2,57%</b>
<b>% d'avancement physique</b>	<b>64,7%</b>	<b>68.5%</b>	<b>3,80%</b>
<b>Nombre de projets achevés</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>3</b>
<b>Nombre de projets en cours</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>-2</b>
<b>Nombre de projets non entamés</b>	<b>06</b>	<b>05</b>	<b>-1</b>



Planning prévisionnel  
d'achèvement du programme

2

# Etat d'avancement global conventionnel et révisé du programme


**NB:**

- \*\* : l'achèvement de 03 projets dépassera la date limite mai 2022 ( 02 parkings + Eco centre )

Avancement prévisionnel



Taux actuel 74,2 %

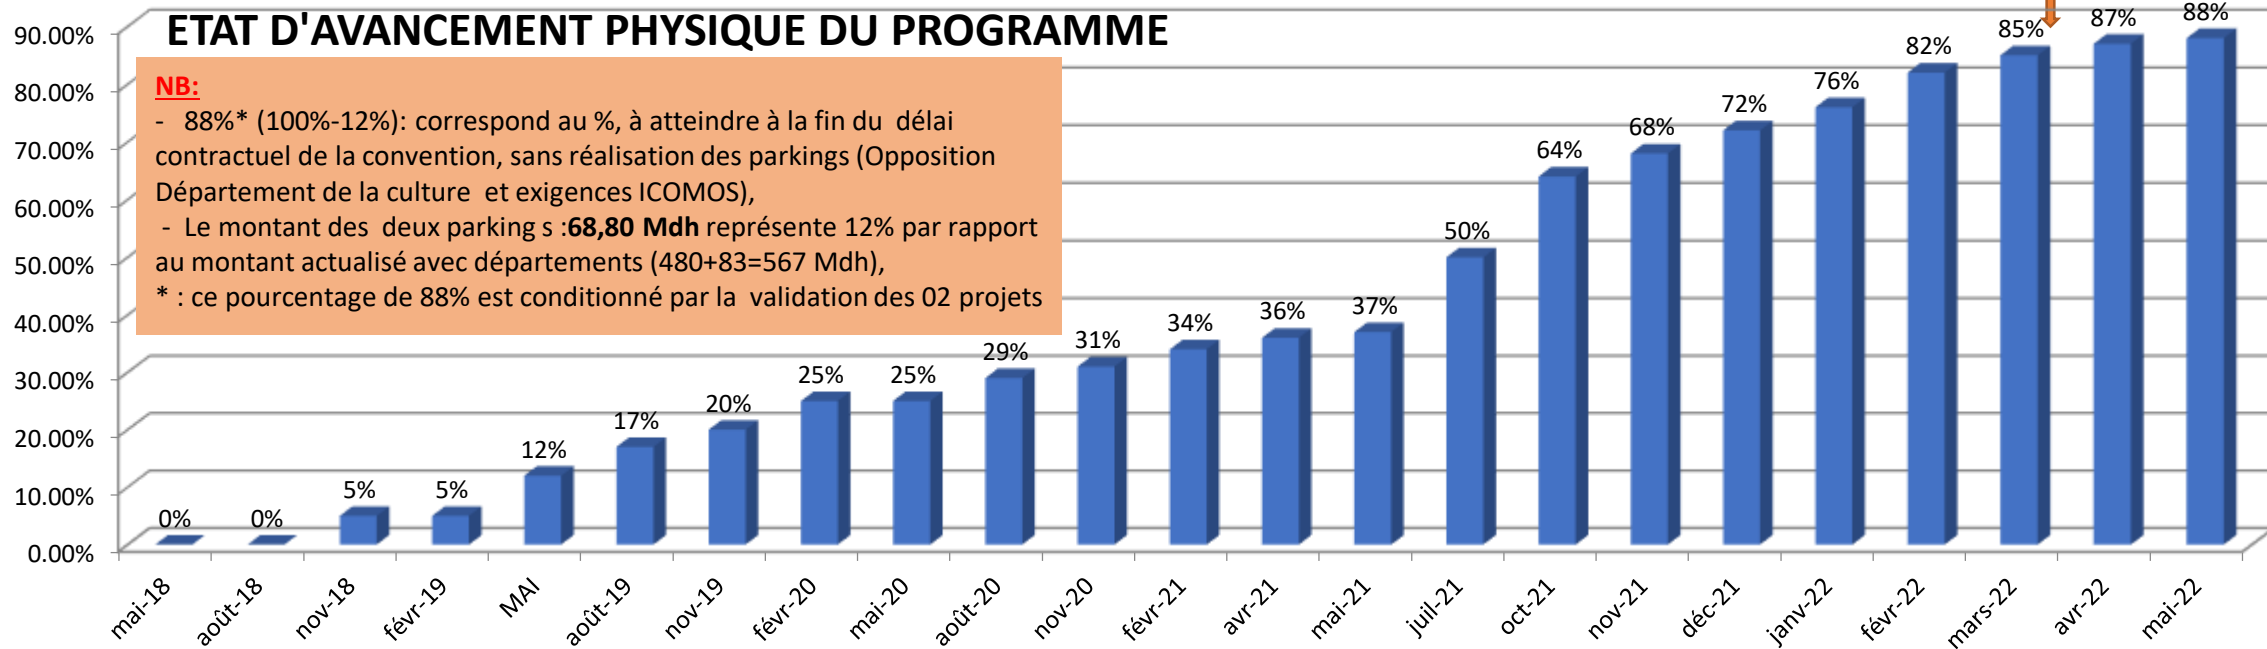

<b>TOTAL DES PROJETS prévisionnel</b>	01	-	-	-	-	06	07	08	12	27	31	41	49	52**
---------------------------------------	----	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	------

<b>TOTAL DES PROJETS réalisé</b>	01	-	-	-	-	06	07	08	11	16				
----------------------------------	----	---	---	---	---	----	----	----	----	----	--	--	--	--

# **SITUATION DES PROJETS DE LA SOCIÉTÉ AL OMRANE**



## ETAT D'AVANCEMENT PAR PROJETS

TOTAL	PROJETS ACHEVES	PROJETS EN COURS DE TRAVAUX	PROJETS NON ENTAMES	TOTAL
Société Al Omrane Marrakech (MOD)	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>47</b>

# SOCIETE AL OMRANE MARRAKECH-SAFI- PROJET ACHEVES

Intitulé du projet	Montant engagé par la SAO(MDH)	Date début travaux	Date d'achèvement travaux	Observations
<b>BAB GHMAT</b>	8,29	27/11/2018	25 / 09 /2020	- Conformité des travaux prononcée à la date du 03/12/2020 par la commission de suivi
BAB EL KSIBA	2,68	13/06/2019	30/10/2020	
(CIRCUIT LONGEANT LA MURAILLE INTERNE DU QUARTIER BAB DOUKKALA) TR1	10,86	27/11/2018	31/10/2019	
ACCÈS OUNK JAMAL ET BAB TAGHZOUTE	3,25	02/04/2019	30/10/2019	
CIRCUIT TOURISTIQUE DE SIDI BOUDCHICH	17,94	27/11/2018	30/11/2020	Réceptionné le 27/11/2020
RESTAURATION ET REHABILITATION FONDOUK MOULAY BOUBKER	5,69	01/10/2019	09/2021	Réceptionné le 15/09/2021
RESTAURATION ET REHABILITATION FONDOUK LBEN	4,26	30/11/2020	30/11/2021	Achevé réceptionné
Jardin Palais municipal	3	30-12-2019	30-12-2021	Achevé réceptionné
ENTREE BAB EL KHMIS PARKING	8,96	15/01/2020	30/12/2021	Achevé réceptionné
RESTAURATION ET REHABILITATION FONDOUK KABBAJ	7,32	15/11/2019	26/01/2022	Achevé réceptionné
Jardin jnan el afia	2,07	28-09-2020	<b>28/02/2022</b>	Achevé réceptionné
PARKING BAB HMAR	3	27/11/2018	28-02-2022	Achevé réceptionné
Circuit des tanneurs	11,24	06-11-2020	28-02-2022	Achevé réceptionné
Circuit touristique entre place Jamaa Fna et place kzadria (Riad Zitoune Kdim)	10,8	16-11-2020	28-02-2022	Achevé réceptionné

## Projets en cours de travaux

Intitulé du projet	Montant de la convention (MDH)	Montant engagé par la SAO(MDH)	Date début travaux	Date Prévisionnelle d'achèvement travaux	Taux d'avancement physique	Observations
					Au 11/03/2022	
CIRCUIT HISTORIQUE DE BAB MOUSSOUFA A RIAD LAAROUS	11,34	34,16	28/02/2019	28/04/2022	96%	DEMARRAGE DES TRAVAUX DE LLA COUVERTURE EN FIN MARS 2022
Circuit Bab Doukkala-Dar El Bacha	11,45	18,17	01-06-2021	30-03-2022	90%	RAS
Circuit place Ibn Youssef et Dar Si Said	9,52	39,59	01-06-2021	30-04-2022	50%	RAS
RESTAURATION ET REHABILITATION FONDOUK LGHRABLYA	6,42	7,19	16/09/2019	30/03/2022	97%	RAS
RESTAURATION DU JARDIN ZENBOUA	4,28	4,45	27/11/2018	30/04/2022	76%	RAS
RESTAURATION ET REHABILITATION FONDOUK LAHNA	4,28	3,64	29/09/2020	30/04/2022	70%	Ras

## Projets en cours de travaux

Intitulé du projet	Montant de la convention (MDH)	Montant engagé par la SAO(MDH)	Date début travaux	Date Prévisionnelle d'achèvement travaux	Taux d'avancement physique	Observations
					Au 11/03/2022	
Circuit entre place Antaki et place Ibn Youssef	9,63	8,38	15-07-2020	30-03-2022	90%	RAS
Circuit touristique Antaki	10,70	9,6	15-07-2020	30-04-2022	80%	RAS
Circuit Souika kasbah	14,45	10	01-12-2020	30-03-2022	96%	RAS.
Circuit touristique entre BAB TAGHZOUTE Diour Saboune	8,45	3,25	24-11-2020	30-03-2022	77%	RAS
Circuit de l'art du bois	23,43	15,3	16-11-2020	30-03-2022	90%	RAS
Fondouk Chemmaâ	2,57	8	19-11-2020	20-03-2022	99%	RAS
Circuit Boulevard Faima Zahra au quartier Rmila	11,77	11,64	01-06-2021	30-04-2022	80%	
Circuit touristique reliant place Ibn Youssef et Place Jamaâ Fna via place Ibn Saleh	46,01	20	15-12-2020	30-03-2022	97%	RAS
Fhoulas	5,14	5,14	Novembre 2018	Mars 2022	85%	Traités dans le cadre des circuits thématiques
Espaces publics (Mise en place de dispositifs de lutte contre incendie)	1,07	1,07	Novembre 2018	Mars 2022	85%	Traités dans le cadre des circuits thématiques

## Projets en cours de travaux

Intitulé du projet	Montant de la convention (MDH)	Montant engagé par la SAO(MDH)	Date début travaux	Date Prévisionnelle d'achèvement travaux	Taux d'avancement physique	Observations
					Au 11/03/2022	
Amélioration des accès Mechouar Kasbah	16,05	8,69	15/06/2021	30/04/2022	50%	EN COURS
Requalification de la Place Jamaa Fna	32,1	32,1	10/06/2021	30/04/2022	66%	RAS
Circuit Riad AL MOKHA	10,91	9,7	07/06/2021	30/04/2022	70%	RAS
Traitement parties dégradées muraille	4	3,5	16/06/2021	30/03/2022	90%	En cours
Circuit touristique entre jardin secret et Hay Zafriti via Mouassine	20,44	17,1	16/06/2021	30/04/2022	40%	En Cours
Jardin koutoubia	1,07	4,27	18/08/2021	30/04/2022	30%	En cours

## Projets en cours de travaux

Intitulé du projet	Montant de la convention (MDH)	Montant engagé par la SAO(MDH)	Date début travaux	Date Prévisionnelle d'achèvement travaux	Taux d'avancement physique	Observations
					Au 11/03/2022	
<b>Circuit touristique entre Bab Ghmate et place Jamaa Fna</b>	<b>15,41</b>	<b>13,70</b>	<b>03/09/2021</b>	<b>30/04/2022</b>	<b>50%</b>	<b>En cours</b>
<b>Panneaux d'adressage</b>	<b>1,07</b>	<b>1,07</b>	<b>06/09/2021</b>	<b>30/04/2022</b>	<b>15%</b>	<b>En cours</b>
<b>Panneaux de signalisation</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>				
<b>Panneaux d'information</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>				
<b>Bornes d'Information Interactives</b>	<b>3,21</b>	<b>3,21</b>				
<b>Skalate AL Mourabidine</b>	<b>5,35</b>	<b>5,35</b>	<b>Sept 2021</b>	<b>Mai 2022</b>	<b>0%</b>	<b>En cours de démarrage</b>
<b>Portes historiques et centres d'interprétation</b>	<b>8,56</b>	<b>4</b>	<b>Novembre 2021</b>	<b>Avril 2022</b>	<b>20 %</b>	<b>En cours</b>
<b>Installation des caméras de surveillance</b>	<b>24</b>	<b>20</b>	<b>MARS 22</b>	<b>DEC 22</b>	<b>05 %</b>	<b>En cours</b>

**Projets en cours d'études**

N°	Intitulé des projets	Montant de la convention (MDH)	Montant estimatif de la SAO (MDH)	Dates communiquées lors du CCP 24-11-2020		Dates réelles		Observations
				Date prévisionnelle de démarrage	Date prévisionnelle d'achèvement	Date de démarrage	Date d'achèvement	
1	-Partie muraille Méchouar Kasbah -Renforcement réseau éclairage public –Signalisation	5,35	5,35	Février 2021	Février 2022	MARS 2022	Mai 2022	DEMARRAGE DES TRAVAUX LE 16 AVRIL 2022

## Projets non entamés

## Bloqués

N°	Intitulé des projets	Montant de la convention (MDH)	Montant estimatif de la SAO (MDH)	Date de démarrage		Date d'achèvement		Observations
				prévue (communiquée lors du CCP 24-11-20)	Conventionnée	Prévue (communiquée lors du CCP 24-11-20)	conventionnée	
1	Parking AL Antaki	12,84	36,1	...	janv,-19	....	déc-19	Analyse réponse ICOMOS ... - En attente processus validation par Ministère Culture
2	Parking Arset Bouaâchrine	14,44	32,60	.....	janv,-19	.....	déc-19	



**PROJETS PRIS EN CHARGE PAR  
LE DÉPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT  
DURABLE**

# ETAT D'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER

Partenaires	Etat des Contributions 2018-2022 (Mdh)							
	Prévu	Débloqué	Taux de déblocage	Engagé	Taux d'engagement	Taux d'avancement physique (A)	Taux d'avancement des études (B)	Taux d'avancement 90 % Global (A)+10%(B)
Ministère Chargé du développement durable	10 (15)	15	150%	8,28	55,2%	52,93%	90%	55,73%

## ETAT D'AVANCEMENT PAR PROJETS

TOTAL	PROJETS ACHEVES	PROJETS EN COURS DE TRAVAUX	PROJETS NON ENTAMES	TOTAL	OBSERVATIONS
Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable – Département du Développement Durable	1	1	1	3	

## Convention de partenariat et de financement relative au programme de mise en valeur de l'ancienne Medina de Marrakech

Contribution du Département du Développement Durable de 10 MDH (**+≈5MDH**) répartie comme suit :

Projets programmés	Montant (Millions DH)				Avancement Physique %	Taux d'engagement %	Total
	2018	2019	2020	2021			
Renforcement du réseau de surveillance de la qualité de l'air par l'acquisition de 04 stations de mesure	06	-	-	-	100	100	06
Mise en place d'un projet pilote de tri des déchets ménagers à la source	-	-	-	07	00	04	07
Sensibilisation et éducation à l'environnement		01	01	00	97	100	02
Total	06	01	01	07	52,93	55,2	≈15

## ACTIONS

Renforcement du Réseau de Surveillance de la Qualité de l'Air par l'acquisition de (4) quatre stations fixes de mesure.

## ETAT D'AVANCEMENT

- Le marché relatif à l'acquisition des stations a été attribué à la société « ENVIROTEC » ;
- **Les 04 stations de mesure ont été acquises, installées, branchées et opérationnelles.**



Station Lalla Aouda Saâdia



Station Centre Régional des métiers de l'éducation et de la formation



Station Complexe sportif Bab Khmis



Station école Ahmed Ennour

## Projet 2 : Sensibilisation et éducation à l'environnement

ACTIONS	ETAT D'AVANCEMENT
<p><b>Equipement des clubs de l'environnement au niveau des écoles et des maisons de jeunes</b></p>	<p>➤ <b>1<sup>ère</sup> cérémonie de distribution des équipements le 14 Juin 2019</b> sous la présidence de Monsieur le Wali et Mme l'ex Secrétaire d'Etat chargée du Développement Durable, et ce en faveur de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 22 clubs de l'environnement des établissements scolaires (lycées, collèges, écoles primaires) ;</li> <li>▪ 2 Maisons de jeunes (Ryad Moukha et Moulay Boazza).</li> <li>▪ 1 établissement de protection sociale (Complexe Social Dar Tifl / Bab Ghmat).</li> </ul> <p>➤ <b>2<sup>ème</sup> cérémonie de distribution des équipements le 06 Avril 2021</b> sous la présidence de Mr. Le Wali, et ce en faveur de 25 établissements scolaires.</p>
<p><b>Mise en place d'un centre d'éducation à l'environnement (CEE)</b></p>	<p>➤ CEE : siège collège El Mansour Eddahbi; - Fourniture des équipements informatiques et audiovisuels en date du 14 Juin 2019 (10 lots).</p>



1<sup>ère</sup> Cérémonie distribution des équipements informatiques et audiovisuels, le 14 Juin 2019



2<sup>ème</sup> Cérémonie distribution des équipements informatiques et audiovisuels, le 06 Avril 2021

## Projet 2 : Sensibilisation et éducation à l'environnement (suite)

ACTIONS	ETAT D'AVANCEMENT
<b>Formation des animateurs des clubs de l'environnement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 2 sessions de formation ont été tenues au titre de 2019 ;<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>1<sup>ère</sup> session du 26 au 28 Juin 2019 à hôtel Ibis Palmeraie Marrakech</b> en faveur des animateurs des clubs de l'environnement des établissements retenus ;</li><li>▪ <b>2<sup>ème</sup> session du 18 au 20 Octobre 2019 à l'hôtel Ibis Palmeraie Marrakech</b> en faveur des animateurs des clubs de l'environnement des établissements retenus.</li></ul></li><li>➤ <b>3<sup>ème</sup> session de formation des éco-animateurs des clubs a eu lieu du 23 au 25 Juin 2021 au siège de la Maison de l'Elu</b> en partenariat avec la Wilaya et l'AREF;</li><li>➤ <b>La 4<sup>ème</sup> et dernière session de formation est prévue au mois de Mars 2022</b> après concertations avec l'AREF;</li><li>➤ <b>Une convention de partenariat relative à la promotion de l'éducation à l'environnement et la création du comité régional de l'éducation à l'environnement a été signée le 04/10/2021</b> par les différentes parties prenantes, à savoir : la Wilaya, la Direction Régionale de l'Environnement, l'AREF, l'AESVT et l'OPM, afin de pérenniser et généraliser les actions lancées en matière d'éducation de l'environnement.</li></ul>



Session de formation des éco-animateurs

## Projet 3 : Mise en place d'un projet pilote de tri des déchets à la source

ACTIONS	ETAT D'AVANCEMENT
<p>Mise en place d'un écocentre de tri et de conditionnement des matériaux recyclables</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Initialement le site convenu pour abriter l'écocentre a été identifié et retenu au niveau de la Commune Méchouar Kasbah après approbation par l'ensemble des partenaires;</b></li> <li>• L'étude de faisabilité technique et financière réalisée et validée par l'ensemble des partenaires concernés;</li> <li>• Le DDD a revu à la hausse le coût de réalisation de ce projet, soit 7MDH au lieu de 2 MDH initialement prévus ;</li> <li>• <b>Recrutement d'un bureau d'architecture (Think+ architects) pour la conception et le suivi architectural de l'écocentre: Tenue de réunion de travail avec la DRE; visite des lieux, préparation de la consultation architecturale diffusée aux principaux partenaires dans ce projet: Wilaya, Commune et Agence Urbaine pour une réunion de validations des documents.</b></li> <li>• <b>Recrutement d'un BET (Hydroprotec) pour l'élaboration de l'EIE du projet: tenue de réunion de travail, visite des lieux , collecte des données et présentation des documents dans la plate forme numérique du CRI.</b></li> <li>• <b>En date du 26 Janvier 2022, la DRE a été informée de l'avis défavorable de la commission administrative mixte chargée de l'examen des grands projets;</b></li> <li>• <b>Le processus de recherche et d'identification d'un nouveau site pouvant abriter l'écocentre a été lancé par Mr le Wali. Ainsi, 04 sites ont été visités au niveau du quartier Mhamid, à la Commune Marrakech. Un 5<sup>ème</sup> site a été proposé par la Commune, situé à proximité de la station solaire et présente des avantages importants pour être retenu.</b></li> <li>• <b>Vu le retard important imposé par la recherche d'un nouveau site et la nécessité de reprendre les études et les démarches de recrutement des BET et de la société, le projet ne pourra être malheureusement réalisé dans les délais fixés dans la convention de partenariat.</b></li> <li>• <b>A souligner que le Département du Développement Durable est bien évidemment disposé à réaliser le projet au niveau du nouveau site à identifier et valider par les partenaires.</b></li> </ul>



**MINISTÈRE DE LA CULTURE**

# Situation Financière

Partenaire	Contribution Globale en (MDH)	Contributions annuelles en (MDH)							
		2018		2019		2020		2021	
		Prévu	Engagé	Prévu	Engagé	Prévu	Engagé	Prévu	Engagé
Ministère de la culture	20	3	0	7	10	7	6,17	3	0

## Situation Financière

**cumulée à ce jour**

Partenaire	Etat des Contributions 2018-2022 (Mdh)				
	Prévu	Engagé	Taux d'engagement	Taux Avancement physique	Observations
Ministère de la culture	20	16 170 012,68	85,85 %	87%	

Prévisions

20 MDH

Engagement financier

16 170 012,68

MDH

Taux d'engagement

85,8 %

## Projets en cours

N°	Intitulé des projets	Coût en (MDH)	Montant engagé	Taux avancement physique	Date prévue de fin	Observations
1	Travaux de restauration et de réhabilitation des abords de la koutoubia	6	2 690 956.00	98%	30/12/2021	
			55 630,00			
2	Travaux de restauration de Bab Agnaou	3	3 599 287.00	90 %	30/12/2021	
	Etude topographique, diagnostic, expertise et suivi		203 037,00			


3	Travaux de restauration et réfection de deux voutes en partie démolie au palais Badiâ, de plancher dégradé de la terrasse d'un bloc sanitaire et travaux de réouverture de porte dans la muraille au palais Badiâ	3	1 411 079.40	achevé	30/06/2021	Opérationnel
	Etude, diagnostic, expertise et suivi		181 800,00			
4	Travaux de restauration et de réhabilitation de la partie Est et de la muraille de Dar Si Said.	2	4 118 945,28	70%	30/04/2022	
	Etude topographique, diagnostic expertise et suivi.		186 850,00			
5	Travaux de restauration et de réhabilitation de la zone Nord-Est des espaces verts de l'Aguedal Ba Hmad du palais Bahia.	6	3 331 378.00	98 %	30/12/2021	
	Etude topographique, diagnostic expertise et suivi.		199 050,00			
	Etudes liées aux travaux d'aménagement du jardin Aguedal Ba Hmad à Marrakech		192 000,00			
	Total (MDH)	20	16 170 012,68			

## **ANNEXE PHOTOS DEPARTEMENT CULTURE**

## Travaux de restauration et de réhabilitation des abords de la Koutoubia



## Travaux de restauration de Bab Agnaou

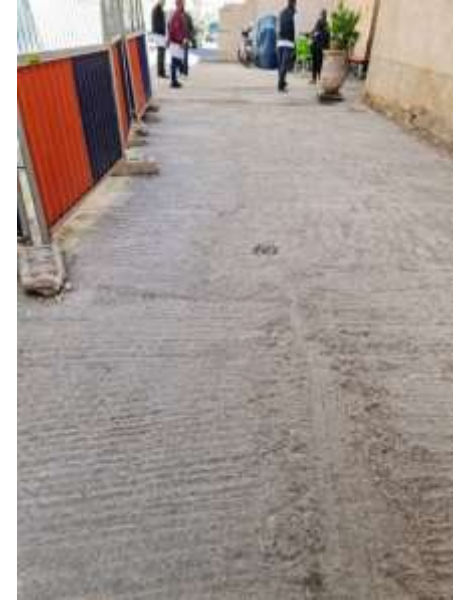

## Travaux de restauration et de réhabilitation de la partie Est et de la muraille de Dar Si Said.





Travaux de restauration et de réhabilitation de la zone Nord-Est des espaces verts de l'Aguedal Ba Hmad du palais Bahia.

